

Avancement du déploiement du réseau

ALL FIBRE
AVEYRON LOT LOZÈRE - LA FIBRE POUR TOUS

1^{er} juin 2020

Situation au 1^{er} juin 2020

- ❑ Cible = 44 zones de NRO (nœud de raccordement optique)
 - ▶ 28 zones démarrées en étude


- ❑ Cible = 400 armoires PM (point de mutualisation)
 - ▶ 276 avant-projets détaillés validés d'implantation d'armoires
 - ▶ 223 armoires installées avec fibre de transport en service (liaison NRO-PM)

- ❑ Cible contractuelle = 131 055 logements/entreprises à desservir
 - ▶ Cible corrigée /relevé de boîtes aux lettres = 115 000 locaux
 - ▶ 37 593 locaux raccordables (= boîtier de rue installé)
 - ▶ éligibilité commerciale : <https://eligibilite-thd.fr/cartographie/AXTD>

- ❑ Cible = 10 000 km de fibres à dérouler

- ❑ Commercialisation
 - ▶ 1 fournisseur d'accès internet (Orange)
 - ▶ 3 221 abonnés raccordés


Progression du déploiement

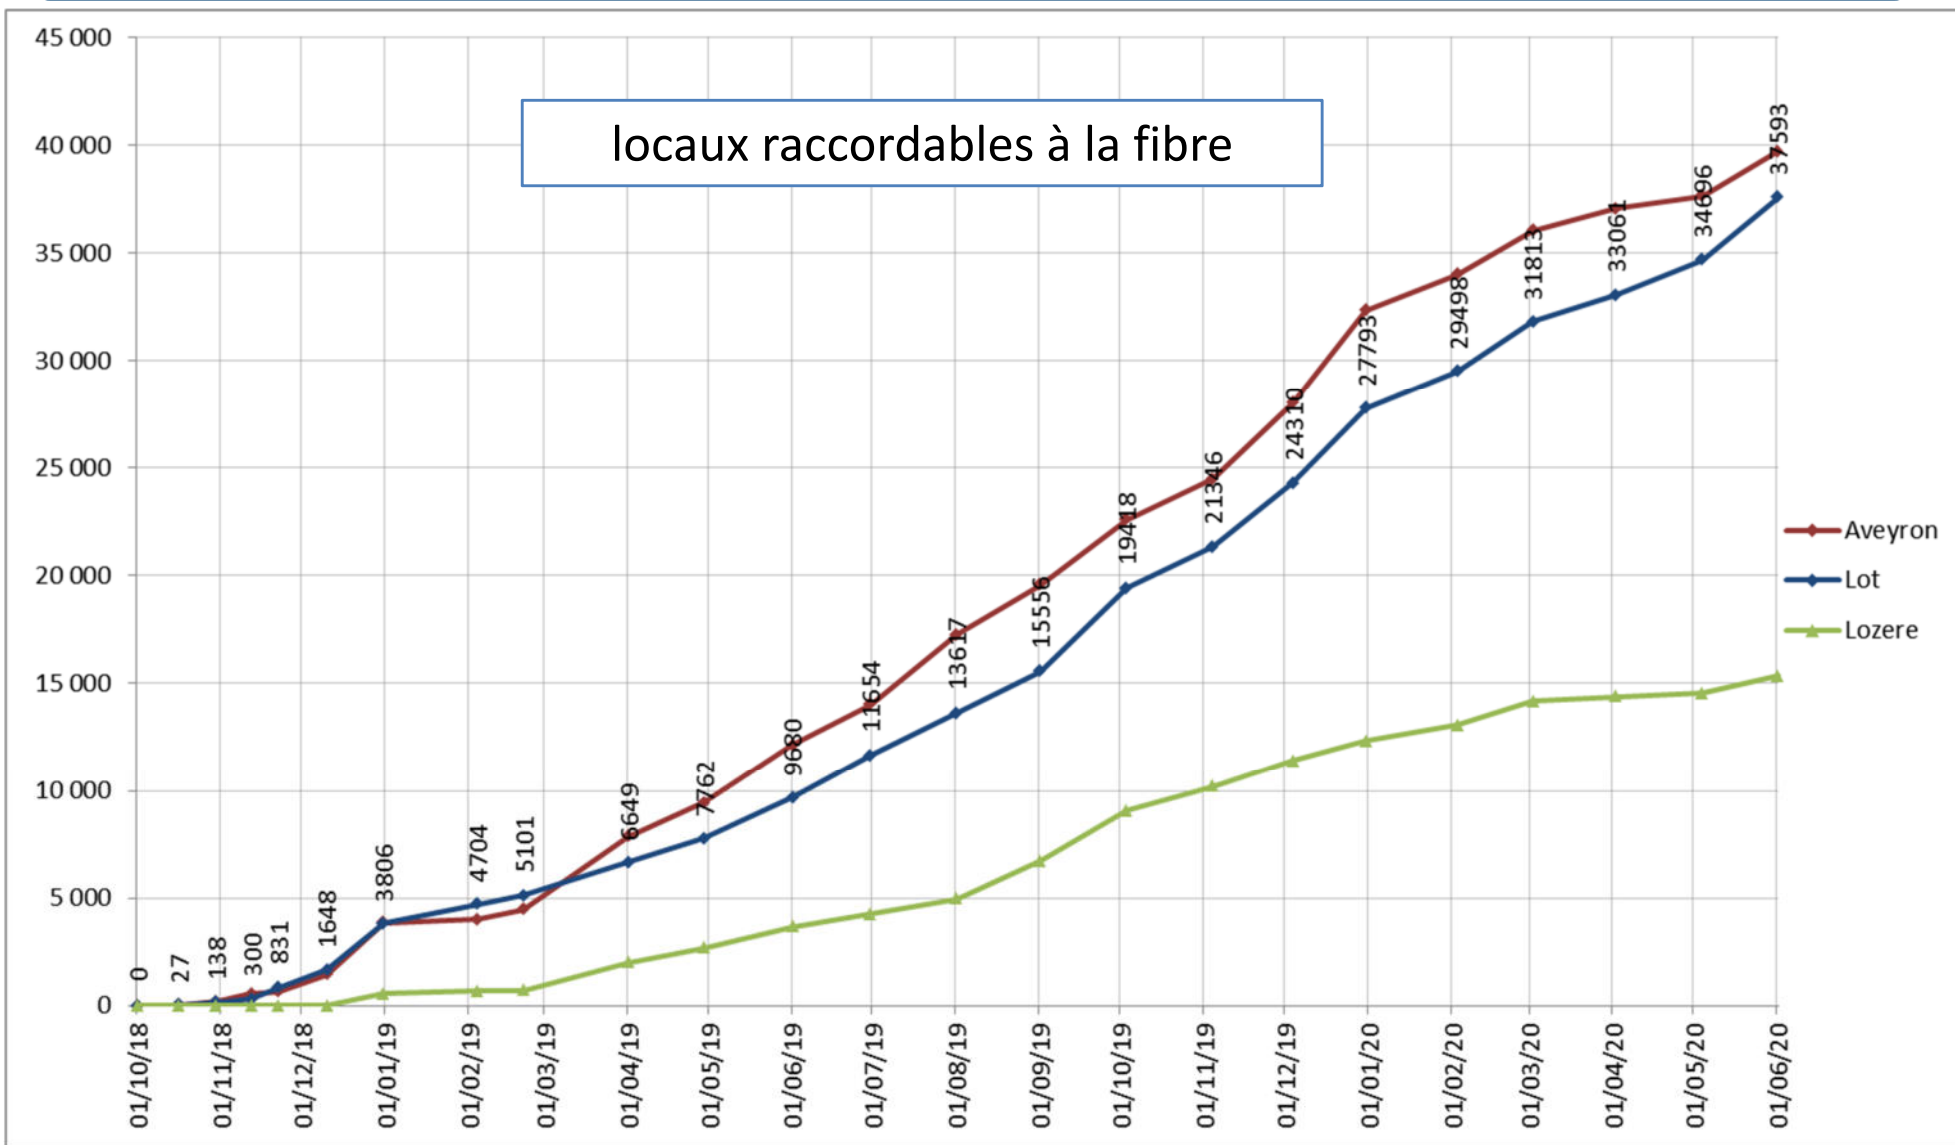

mise à jour mensuelle




Cible du déploiement

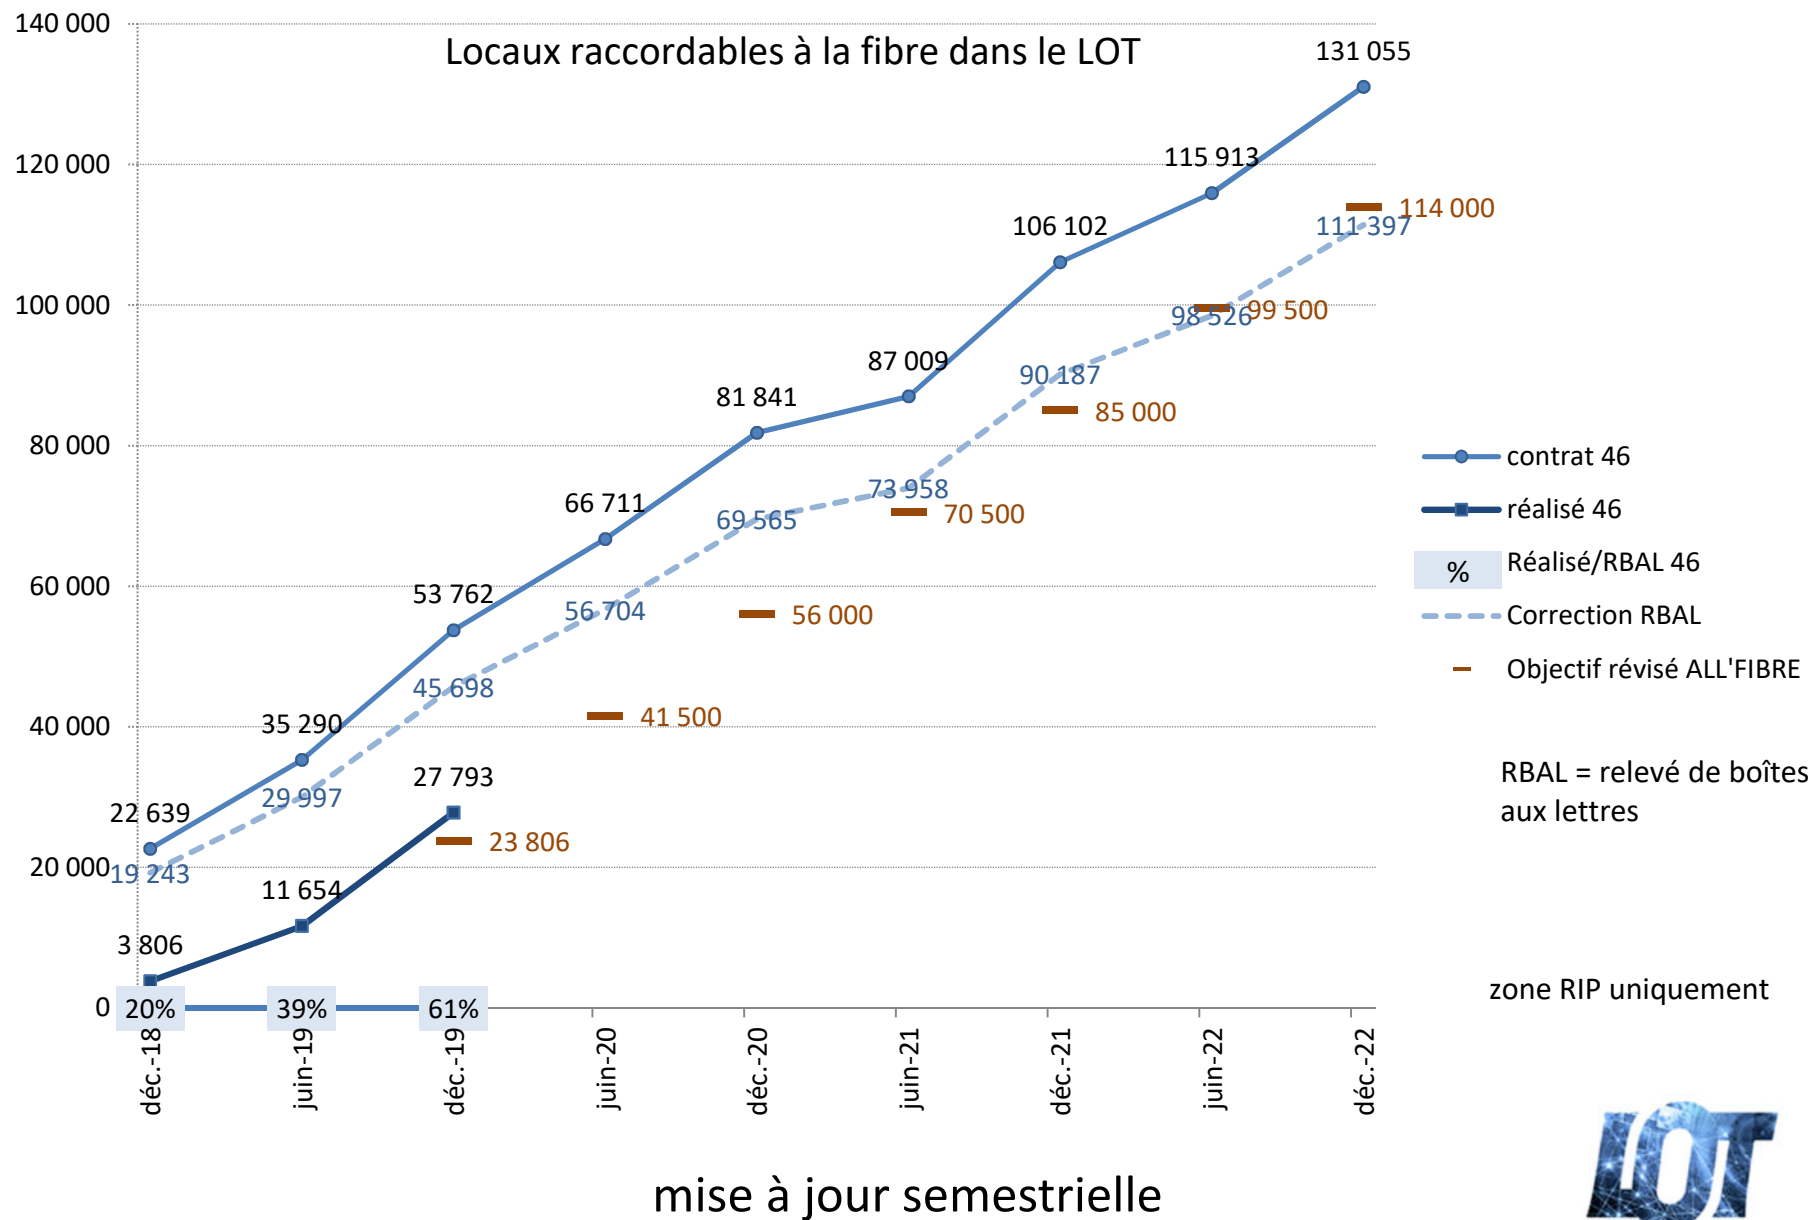

Répartition par EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES	Logements raccordables	Abonnés raccordés
CdC Causses et Vallée de la Dordogne	10 895	357
CdC Cazals-Salviac	530	0
CdC de la Vallée du Lot et du Vignoble	5 169	525
CdC du Causse de Labastide-Murat	482	3
CdC du Pays de Lalbenque-Limogne	2 365	281
CdC du Quercy Blanc	749	45
Ouest Aveyron Communauté (12)	0	0
CdC Grand Figeac	10 683	1 226
CdC Quercy Bouriane	6 163	814
Cté d'Agglomération du Grand Cahors	557	70
TOTAL	37 593	3 221

Carte du déploiement

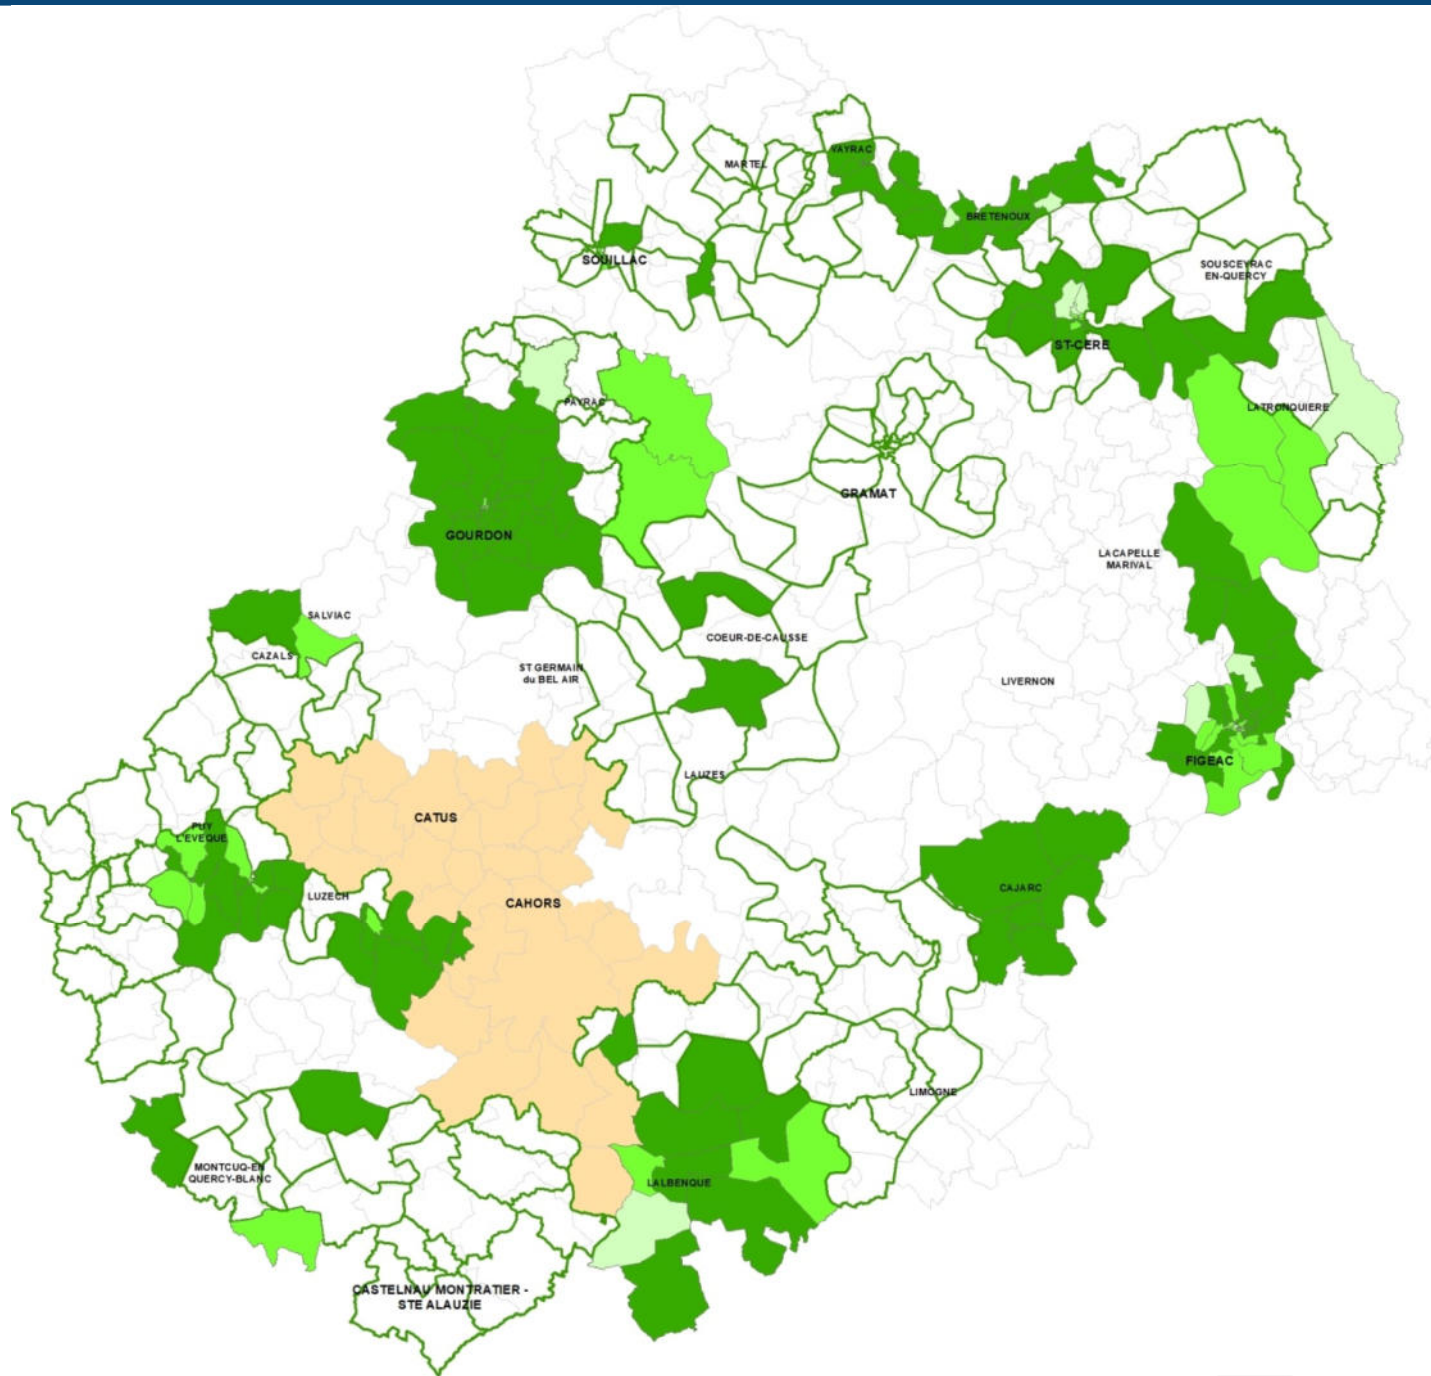

- communes
- zone AMII

logements raccordables

- 80 à 100%
- 50 à 80%
- 0 à 50%
- armoires implantées

